
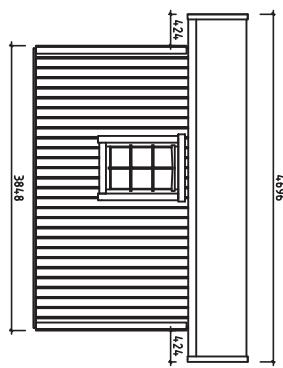
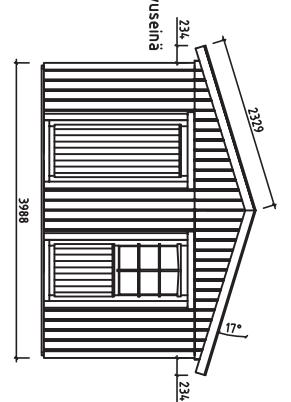


Views and ground plan - Fasader och grundplan - Julkisivut ja pohjapiirustus

Back wall-vägg baksida-takaseinä


Roof MAX 100kg/m<sup>2</sup>

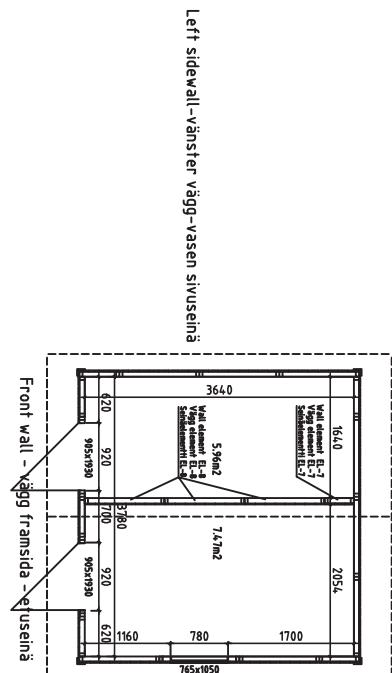

v2.0

House	F3939-16 Möja	Sheet	1
Drawing		Scale	1:100
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F3939-16 Möjädung

Overview description of the manual - Översiks beskrivning för montering - Kokoonpano - ohjeiden kuvaaminen

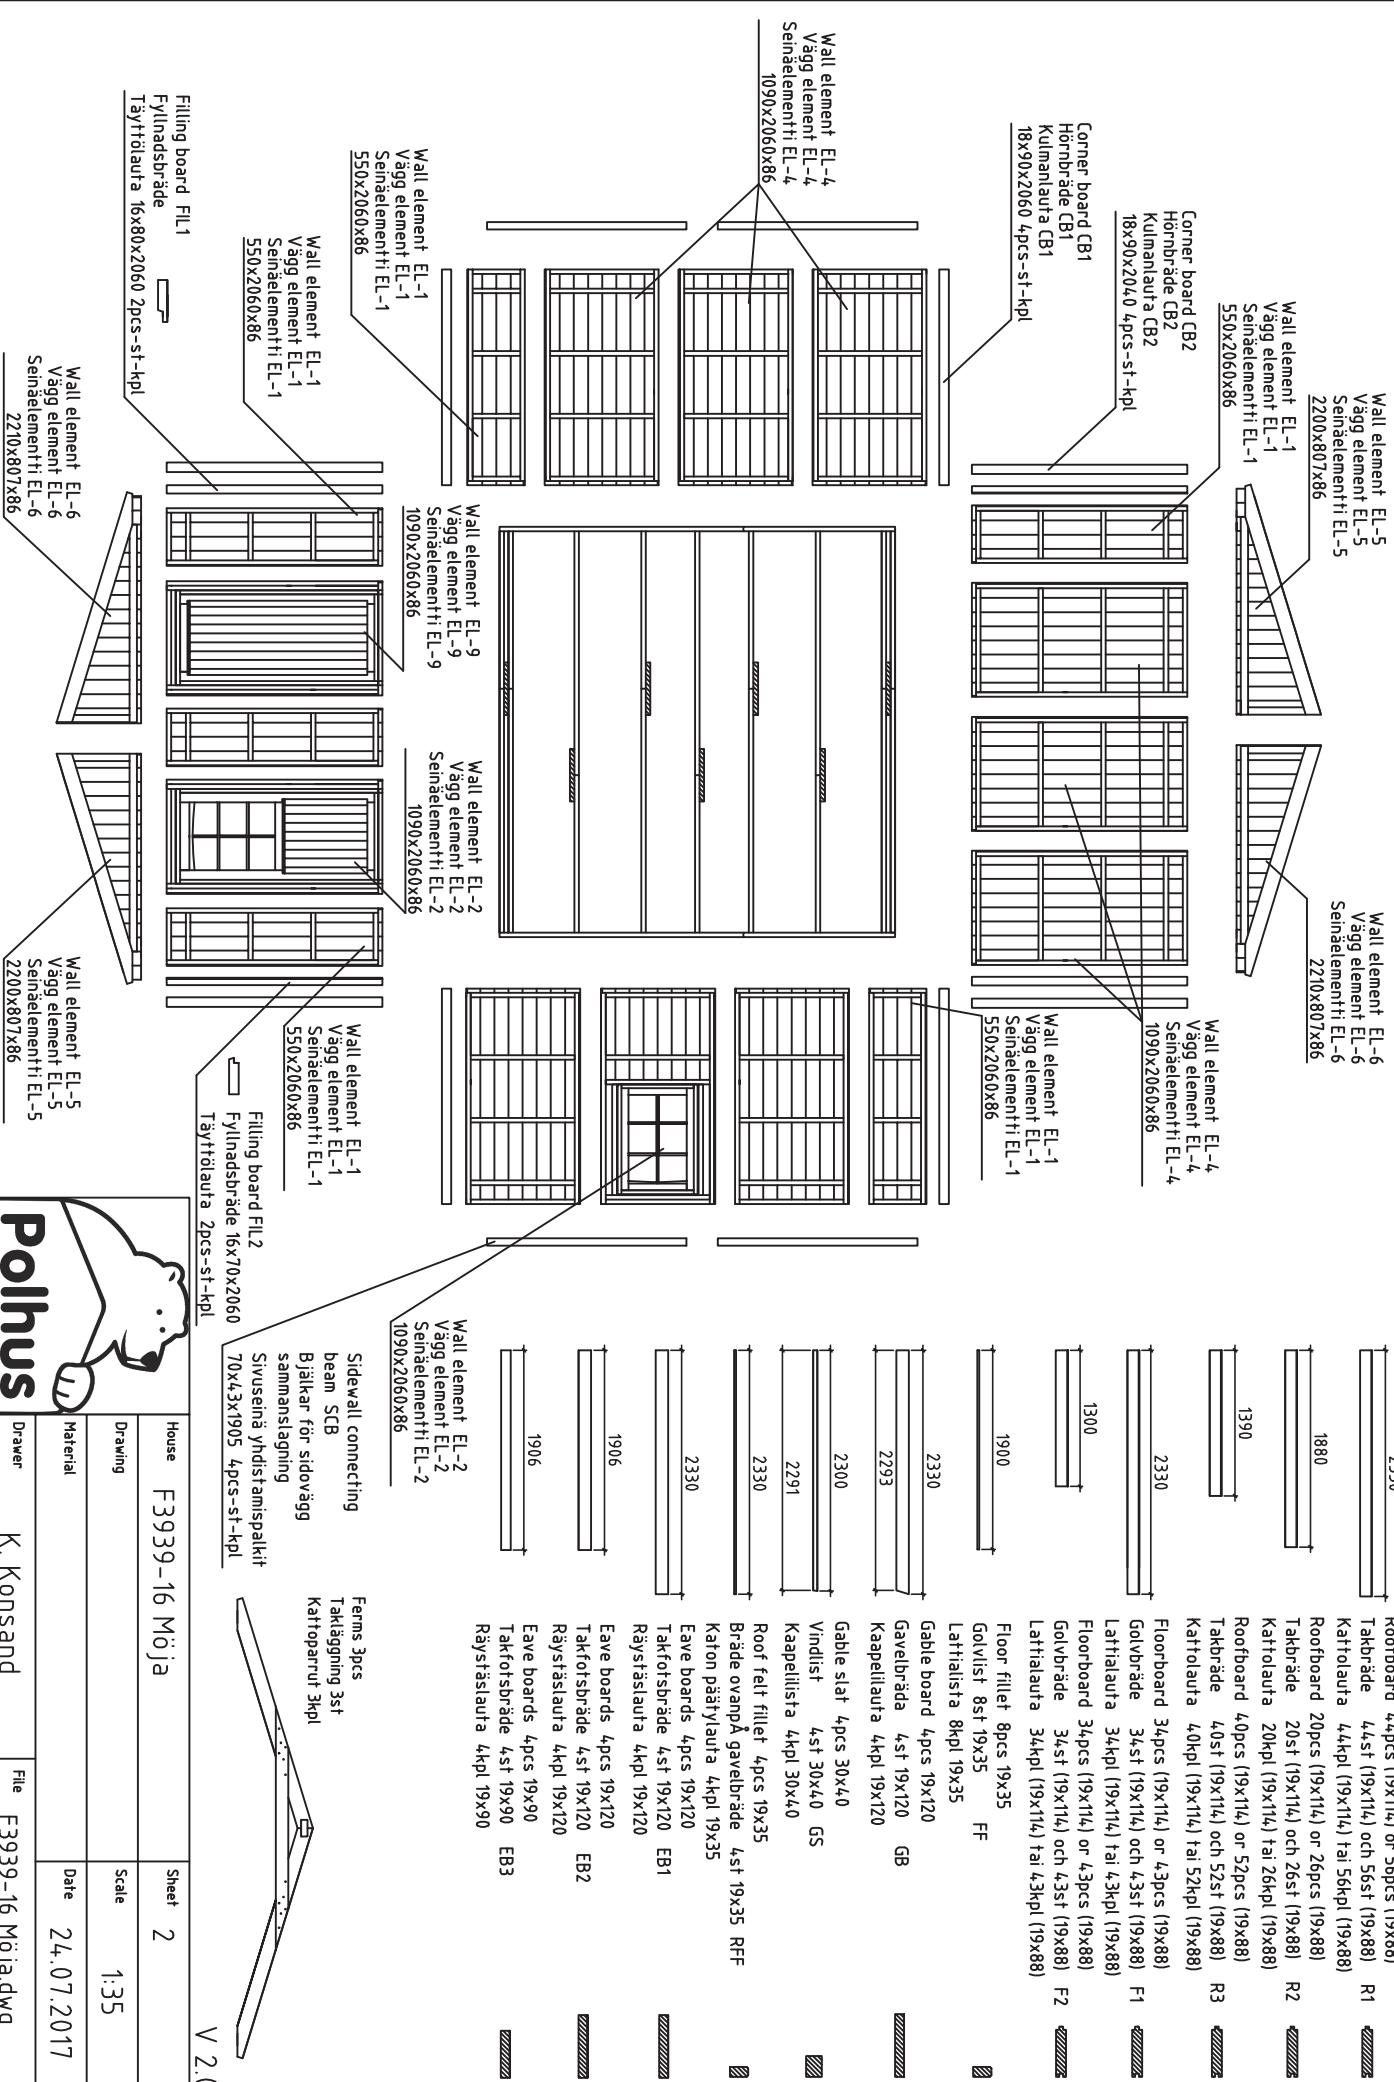

The logo for Polhus features a black silhouette of a polar bear standing on its hind legs, leaning forward with its front paws touching. The bear's head is turned slightly to the right, showing its profile. To the left of the bear, the word "Polhus" is written vertically in a bold, sans-serif font.

House
Drawing
Material

F3939

9-16 M

Möja

1

File  
F3

Sheet

2


35  
7.2017

۲۰


1

Installation of floorbeams and floorboards - montering av golvbjälkar samt golv bräder - laftia palkien ja laftia autojen asennus

Floorboards L=2330mm  
Golvbräde L=2330mm  
Lattialauta L=2330mm  
Floorboards L=1300mm  
Golvbräde L=1300mm  
Lattialauta L=1300mm

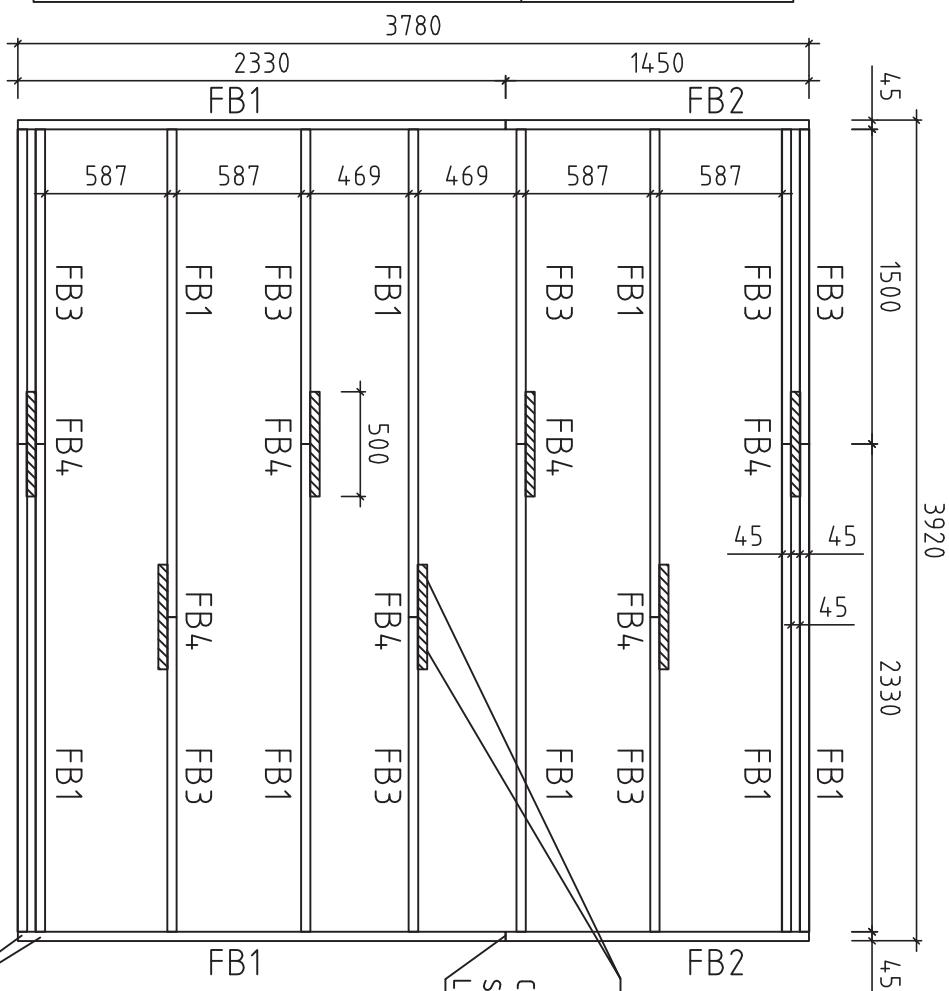

Connect with metal plate 60x160+ screws 4,5x45 8pcs  
Skärvas med metall platta 60x160+skruvar 4,5x45 8st  
Liitäään metallilevylle 60x160+ruuvit 4,5x45 8kpl




Connect with screws 4.5x70  
Skrivas samman med skruvar 4.5x70 

Floorboards L=1300mm  
Golvbräde L=1300mm  
Latrilaulta L=1300mm

NB!!! Change the floorboard positions after every row

NB!!! Skarva golv bräddorna olika efter varje rad

NB!!! Muuta laittialautojen sijaintia jokaisen rivin jälkeen




House	F3939-16 Möja	Sheet	3
Drawing	Floorbeams-lattia-palkit-golvbjälkar	Scale	1:35
Material	45x90	Date	24.07.2017
Drawer	K. Konstrand	File	F3939-16 Möja.dwg

Installation of wall element EL-1 - montering av vägg element EL-1 - seinäelementti EL-1 asennus

(Front wall - vägg framsida - etuseinä)

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

Wall element EL-1  
Vägg element EL-1  
Seinäelementti EL-1

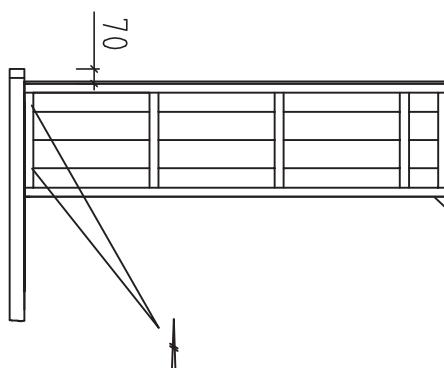

Fix wall element EL-1 with screws


4.5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-1 med skruvar

4.5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ruuveilla

4.5x70 laittapalkkin

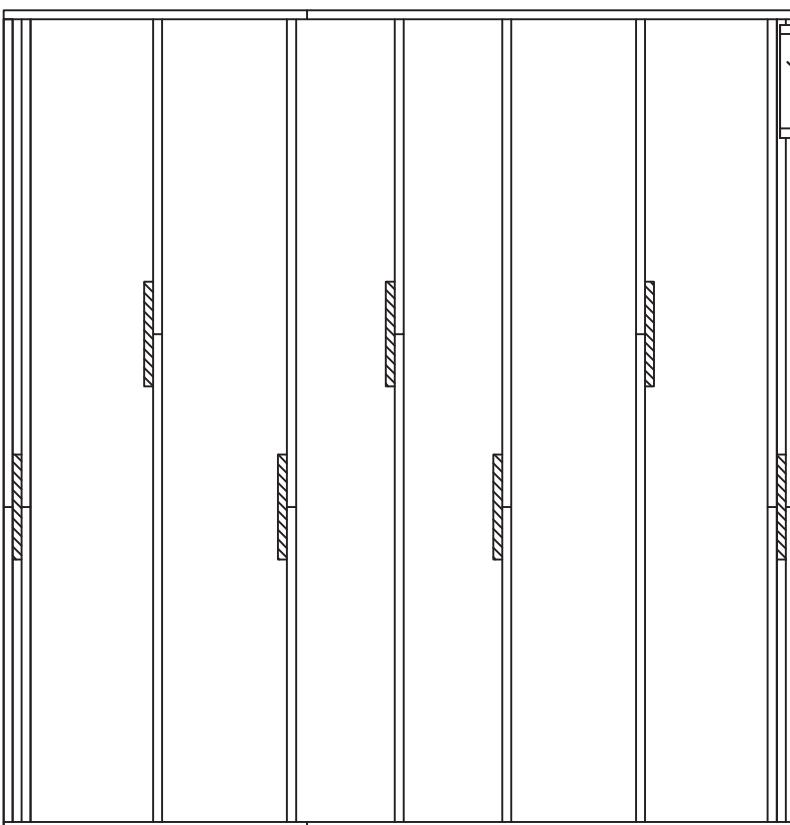


✓ 2.0

<b>Polhus</b>	
House	F 3939-16 Möja
Drawing	
Material	
Drawer	K. Konsand
File	F 3939-16 Möja.dwg
Sheet	4
Scale	1:35
Date	24.07.2017

## Installation of wall element EL-2 and EL-1 - montering av vägg element EL-2 och EL-1 -seinäelementin EL-2 ja EL-1 asennus

(Front wall - vägg framsida - etuseinä)

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

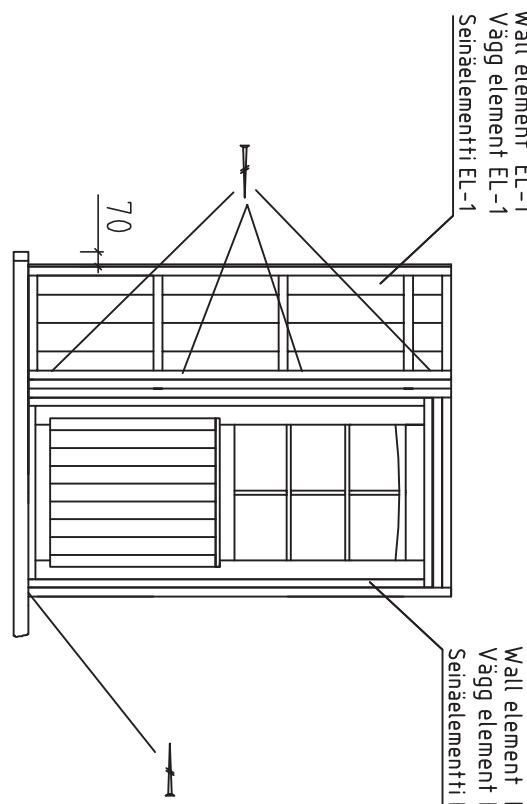


- Fix wall element EL-2 with screws
- 4,5x70 into floorbeam
- Fixera vägg element EL-2 med skruvar
- 4,5x70 i golvbjälke
- Kinnitä seinäelementti EL-2 ruuveilla
- 4,5x70 lattipalkkin
- Fix wall elements EL-2 and EL-1 with screws
- 4,5x70 together


Fixera vägg element EL-2 och EL-1 med skruvar

4,5x70 tillsammans

Kinnitä seinäelementit EL-2 ja EL-1 yhteen ruuveilla 4,5x70

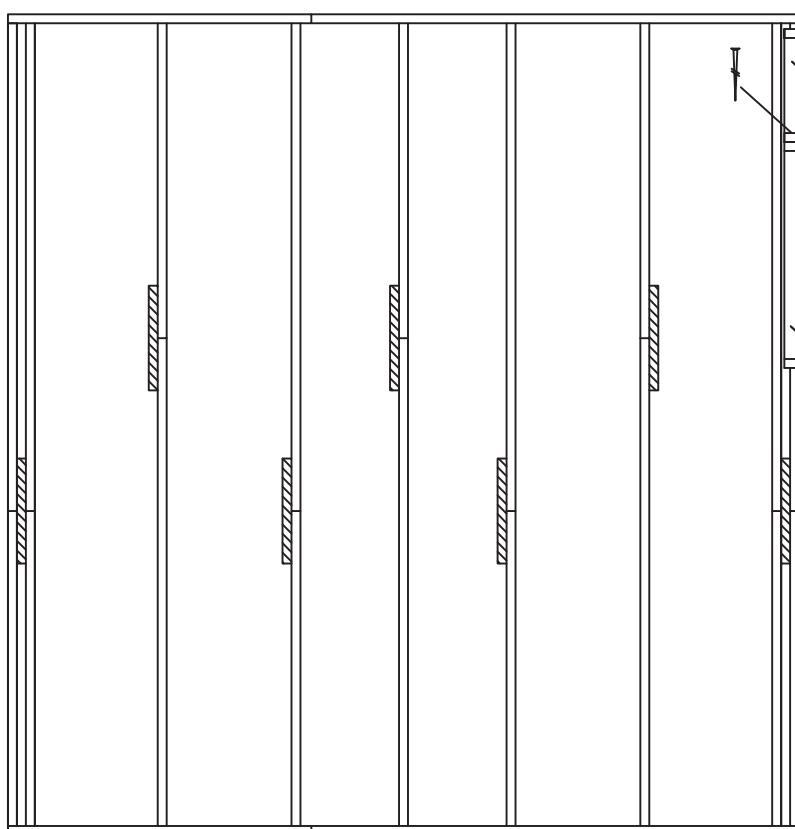



✓ 2.0



House	F 3939-16 Möja	Sheet	5
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

# Installation of wall element EL-1 and EL-2 - montering av vägg element EL-1 och EL-2 -seinäelementti EL-1 ja EL-2 asennus

(Front wall - vägg framsida - etuseinä)



Fix wall element EL-1 with screws

4.5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-1 med skruvar

4.5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ruuveilla

4.5x70 lattiapalkki

Fix wall elements EL-1 and EL-2 with screws

4.5x70 together


Fixera vägg element EL-1 och EL-2 med skruvar

4.5x70 tillsammans

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ja EL-2




yhteen ruuveilla 4.5x70

✓ 2.0



House	F 3939-16 Möja	Sheet	6
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

Installation of wall element EL-3 and EL-1 - montering av vägg element EL-3 och EL-1 -seinäelementtiin EL-3 ja EL-1 asennus  
 (Front wall - vägg framsida - etuseinä)

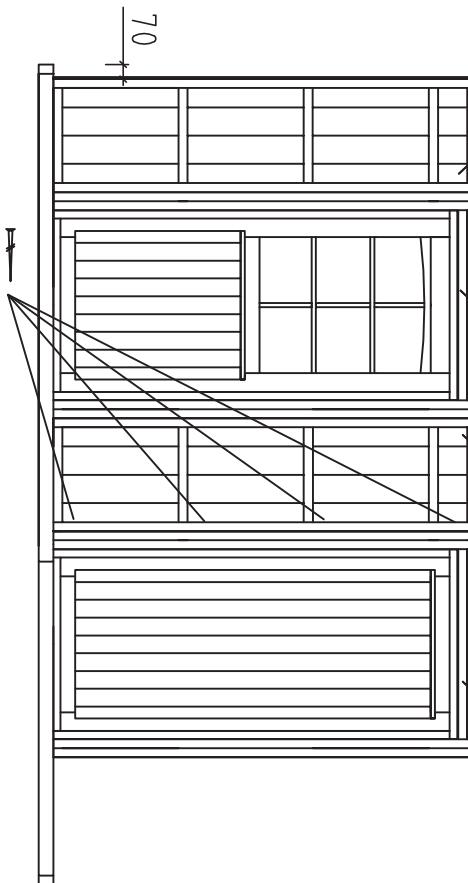

Fix wall element EL-3 with screws

4,5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-3 med skruvar

4,5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti EL-3 ruuveilla

4,5x70 lattipalkkin

Fix wall elements EL-3 and EL-1 with screws

4,5x70 together


Fixera vägg element EL-3 och EL-1 med skruvar

4,5x70 tillsammans

Kiinnitä seinäelementti EL-3 ja EL-1

yhteen ruuveilla 4,5x70

✓ 2.0



House	F 3939-16 Möja	Sheet	7
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

Installation of wall element EL-1 and EL-3 - montering av vägg element EL-1 och EL-3 -seinäelementtiin EL-1 ja EL-3 asennus  
 (Front wall - vägg framsida - etuseinä)

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

Wall element EL-1  
 Vägg element EL-1  
 Seinäelementti EL-1

Wall element EL-2  
 Vägg element EL-2  
 Seinäelementti EL-2

Wall element EL-1  
 Vägg element EL-1  
 Seinäelementti EL-1

Wall element EL-9  
 Vägg element EL-9  
 Seinäelementti EL-9

Wall element EL-1  
 Vägg element EL-1  
 Seinäelementti EL-1

Wall element EL-2  
 Vägg element EL-2  
 Seinäelementti EL-2

Wall element EL-9  
 Vägg element EL-9  
 Seinäelementti EL-3



Fix wall element EL-1 with screws

4,5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-1 med skruvar

4,5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ruuveilla

4,5x70 lattipalkkin

Fix wall elements EL-1 and EL-3 with screws

4,5x70 together



Fixera vägg element EL-1 och EL-3 med skruvar

4,5x70 tillsammans

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ja EL-3

yhteen ruuveilla 4,5x70

✓ 2.0

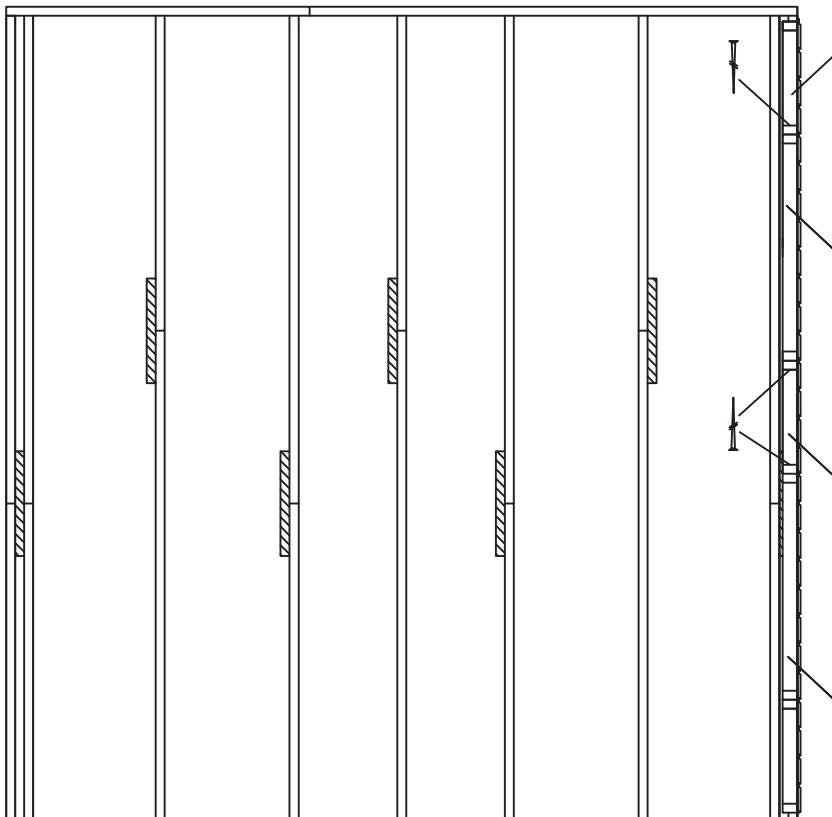

House	F 3939-16 Möja	Sheet	8
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

## Installation of left sidewall - montering av vänster sidovägg - vasen sivuseinä asennus

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä


Wall element EL-1  
Vägg element EL-4  
Seinäelementti EL-1

Wall element EL-1  
Vägg element EL-1  
Seinäelementti EL-4

Wall element EL-2  
Vägg element EL-2  
Seinäelementti EL-1

Wall element EL-1  
Vägg element EL-1  
Seinäelementti EL-9

Wall element EL-1  
Vägg element EL-1  
Seinäelementti EL-1

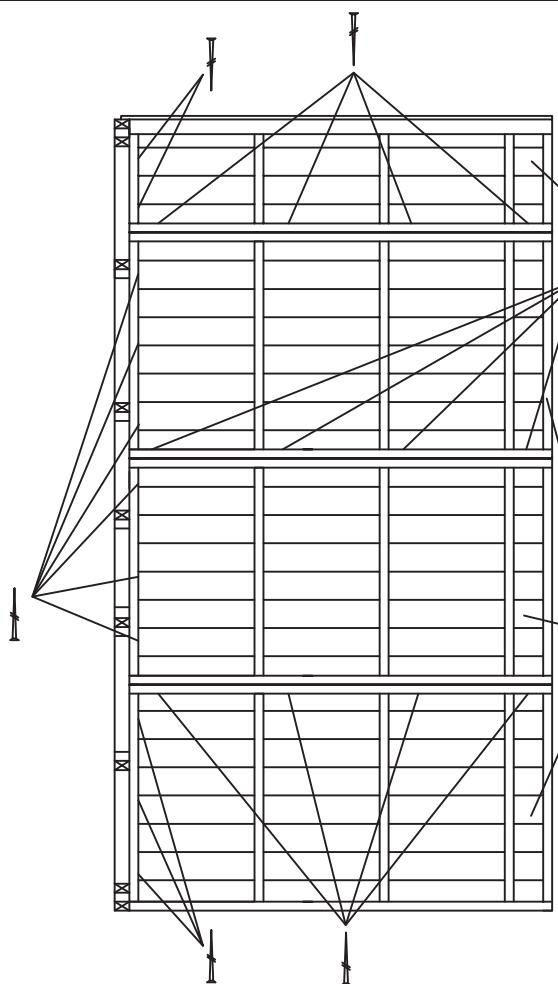

Fix wall element EL-1 and EL-4 (3pcs) with screws

4,5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-1 och EL-4 (3st) med skruvar

4,5x70 i golvbjälke

Kinnitä seinäelementti EL-1 ja EL-4 (3kpl) ruuveilla


4,5x70 lattiapakkin

Fix wall elements EL-1 and EL-4 with screws 4,5x70 together

Fixera vägg element EL-1 och EL-4 med skruvar 4,5x70 tillsammans



Kinnitä seinäelementit EL-1 ja EL-4 yhteen ruuveilla 4,5x70

✓ 2.0



House	F 3939-16 Möja	Sheet	9
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

Installation of back wall - monterings av vägg baksida - takaseinä asennus

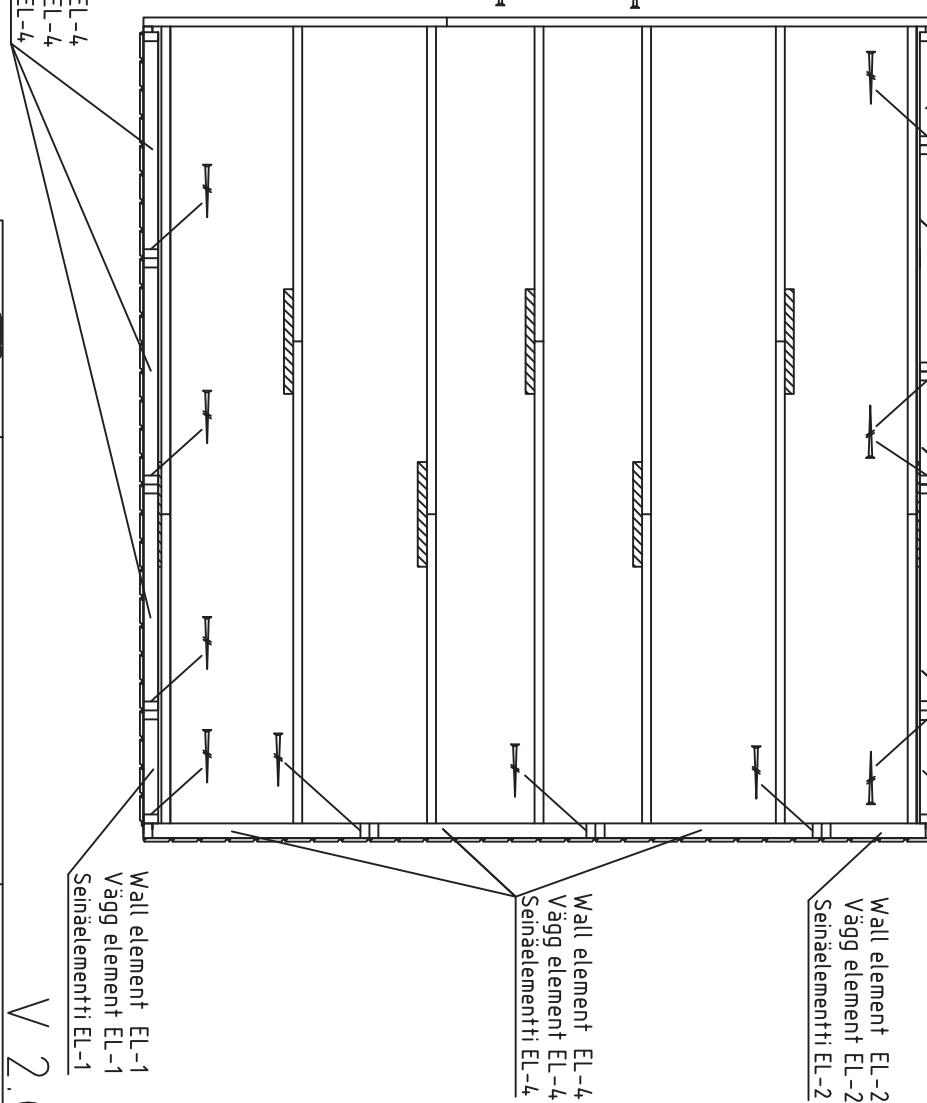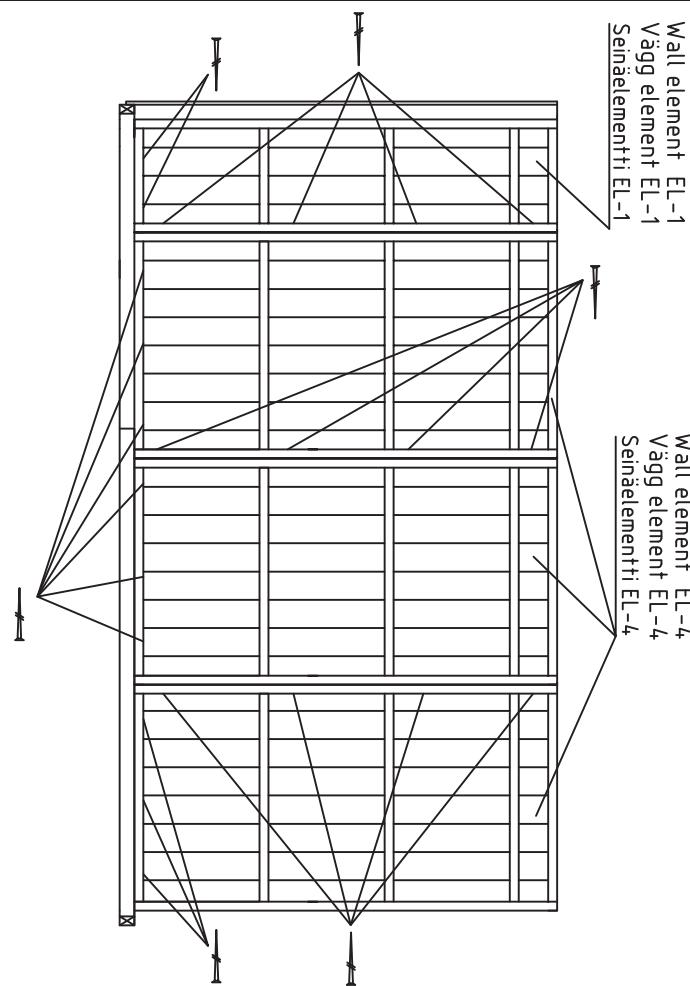

Fix wall element EL-1 and EL-4 (3pcs) with screws

4.5x70 into floorbeam

Fixera vägg element EL-1 och EL-4 (3st) med skruvar

4.5x70 i golvbjälke

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ja EL-4 (3kpl) ruuveilla


4.5x70 lattiapalkkiin

Fix well all elements  $E| -1$  and  $E| - /$ , with screams  $/$ .  $\Sigma^{\geq 0}$  together

Fix wall elements LL-1 and LL-4 with screws 4.2x10 together.

Fixera Vagg element EL-1 och EL-4 med skruvar 4,5x10 Hultsmanitell

Kiinnitä seinäelementti EL-1 ja EL-4 yhteen ruuveilla 4,5x70





House	F 3939-16 Möja	Sheet	10
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konssand	File	F 3939-16 Möja.dwg



Installation of wall element EL-7 and EL-8 - montering av vägg element EL-7 och EL-8 -seinäelementin EL-7 ja EL-8 asennus  
 (Front wall - vägg framsida - etuseinä)

View from inside - Fran insidan - Nakyma sisältä

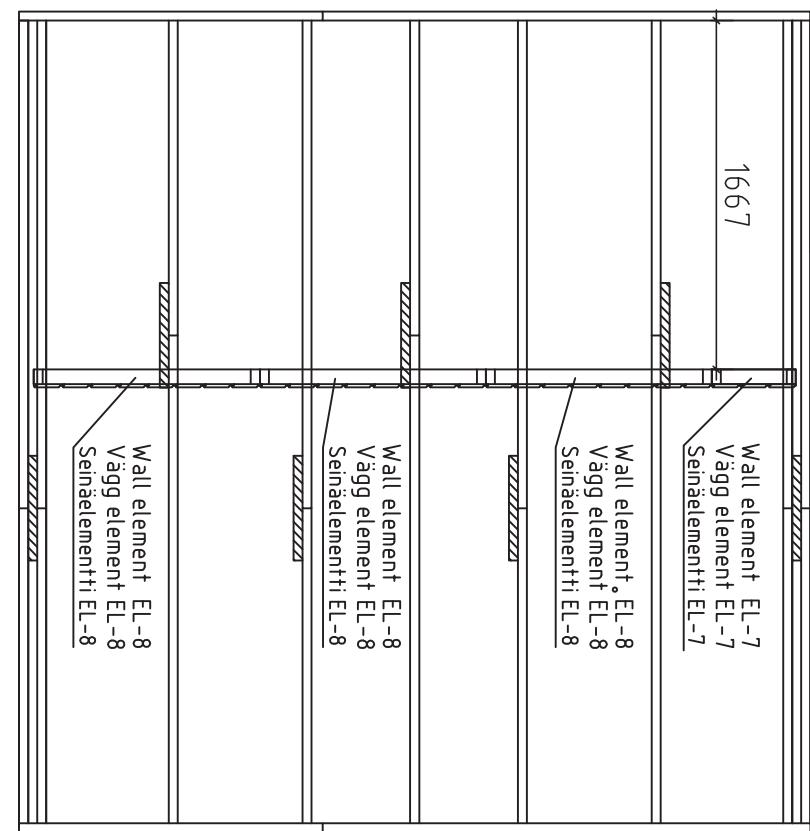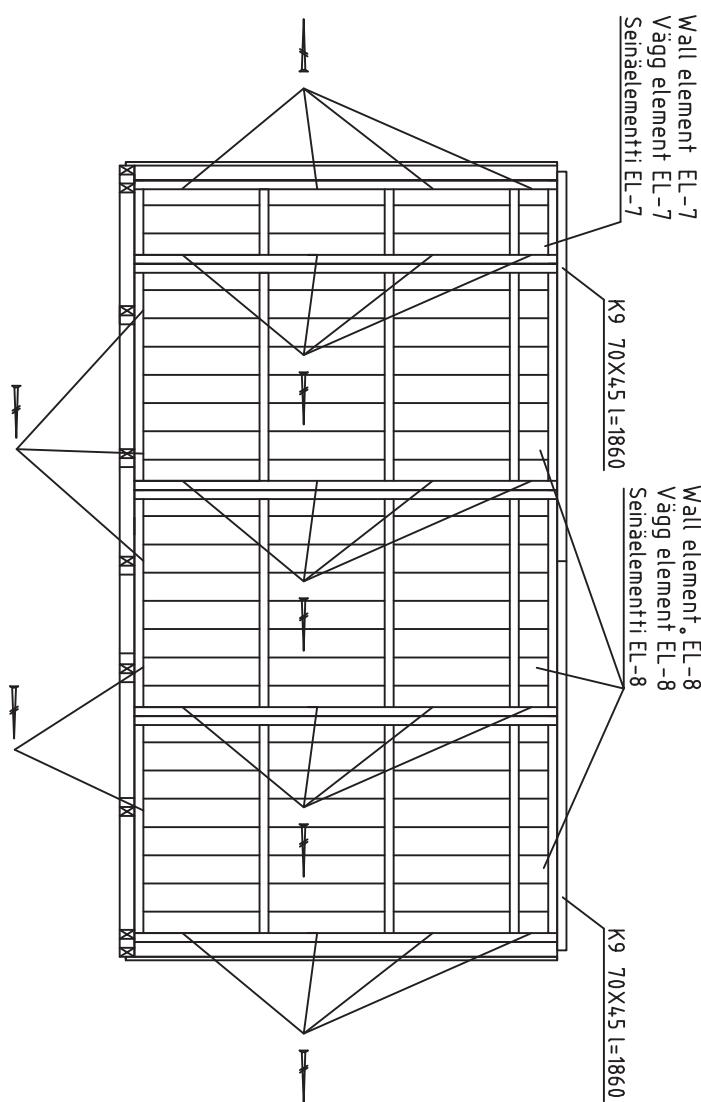


House	F 3939-16 Möja	Sheet	11A
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

✓ 2.0

Fix wall element EL-7 and EL-8 (3pcs) with screws  
 4.5x70 into floorbeam  
 Fixera vägg element EL-7 och EL-8 (3st) med skruvar  
 Kinnitä seinäelementti EL-7 ja EL-8 (3kpl) ruuveilla  
 4.5x70 lattiapalkkiin

Fix wall elements EL-7 and EL-8 with screws 4.5x70 together

Fixera vägg element EL-7 och EL-8 med skruvar 4.5x70 tillsammans  
 Kinnitä seinäelementti EL-7 ja EL-8 yhteen ruuveilla 4.5x70



**Polhus**

Installation of sidewall connecting beams - montering av bjälkar för sidovägg sammanslagning - sivuseinän yhdistämispalkit asennus

Screws 4.5x70 4pcs  
Skrubar 4.5x70 4st  
Ruuvit 4.5x70 4kpl

Screws 4.5x70 4pcs  
Skrubar 4.5x70 4st  
Ruuvit 4.5x70 4kpl

Screws 4.5x70 4pcs  
Skrubar 4.5x70 4st  
Ruuvit 4.5x70 4kpl

Screws 4.5x70 4pcs  
Skrubar 4.5x70 4st  
Ruuvit 4.5x70 4kpl


Screws 4.5x70  
Skrubar 4.5x70  
Ruuvit 4.5x70

Detail A


Detail A

✓ 2.0

Sidewall-sidovägg-sivuseinä



SCB

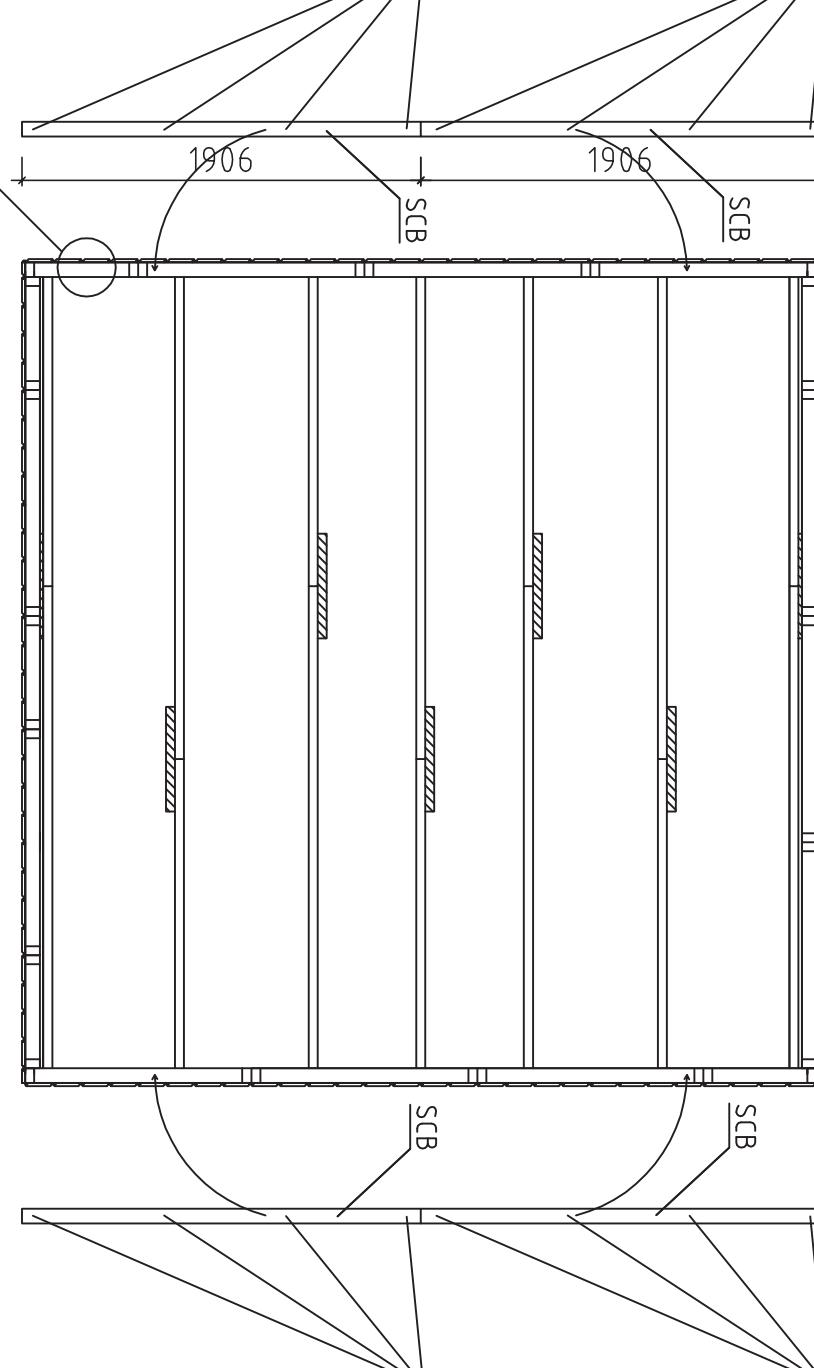


SCB

SCB

SCB

SCB



Polhus

House

F 3939-16 Möja

Sheet 12

Drawing

Scale 1:35

Material

Date 24.07.2017

Drawer


K. Konsand

File F 3939-16 Möja.dwg

Installation of wall element EL-5 and EL-6 - montering av vägg element EL-5 och EL-6 -seinäelementin EL-5 ja EL-6 asennus  
 (Front wall - vägg framsida - etuseinä)

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

Connect with metal plate 60x160 +screws 5.0x40  
 Skruvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40  
 Liittää metallilevyllä 60x160+ruuvit 5.0x40

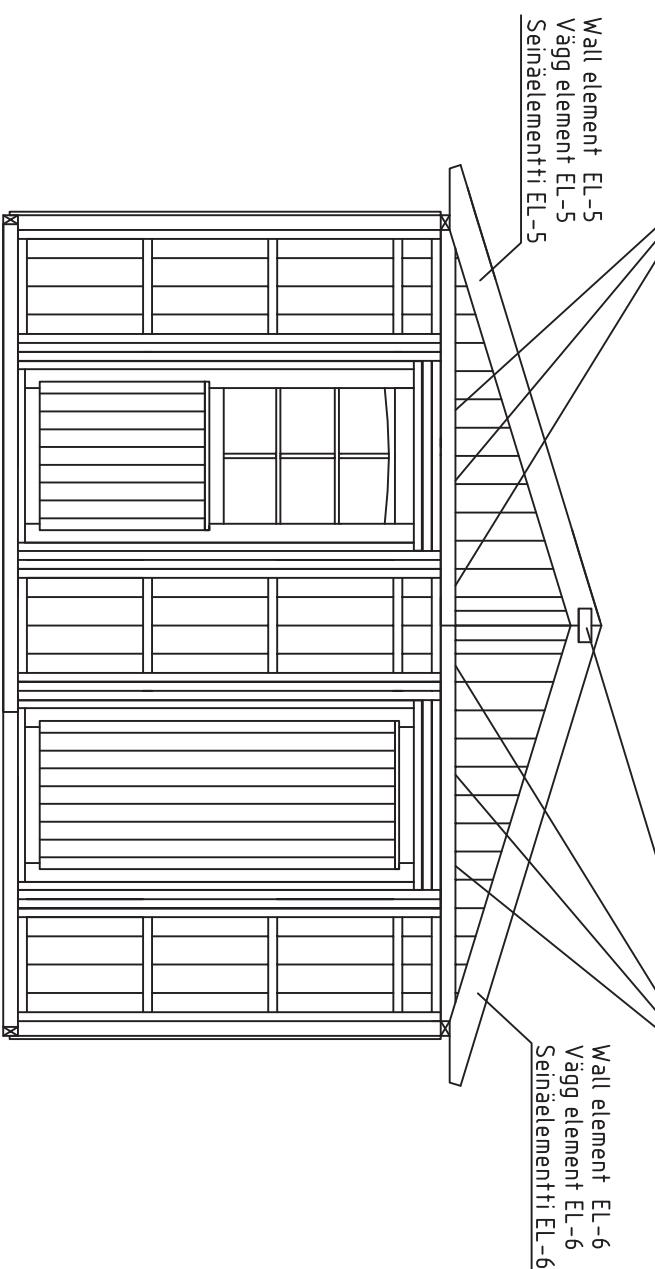

Fix wall element EL-5 with front wall elements with screws 5.0x120 together

Fixera vägg element EL-5 med elementat vägg framsida med skruvar 5.0x120 tillsammans


Kinnitä seinäelementti EL-5 yhteen etuseinän elementit ruuveilla 5.0x120

Fix wall element EL-6 to front wall elements with screws 5.0x120 together

Fixera vägg element EL-6 med elementat vägg framsida med skruvar 5.0x120 tillsammans

Kinnitä seinäelementti EL-6 yhteen etuseinä elementit ruuveilla 5.0x120

✓ 2.0




House	F 3939-16 Möja	Sheet	13
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

# Installation of wall element EL-5 and EL-6 - montering av vägg element EL-5 och EL-6 -seinäelementin EL-5 ja EL-6 asennus

(Back wall-vägg baksida-takaseinä)

View from inside - Från insidan - Nakyma sisältä

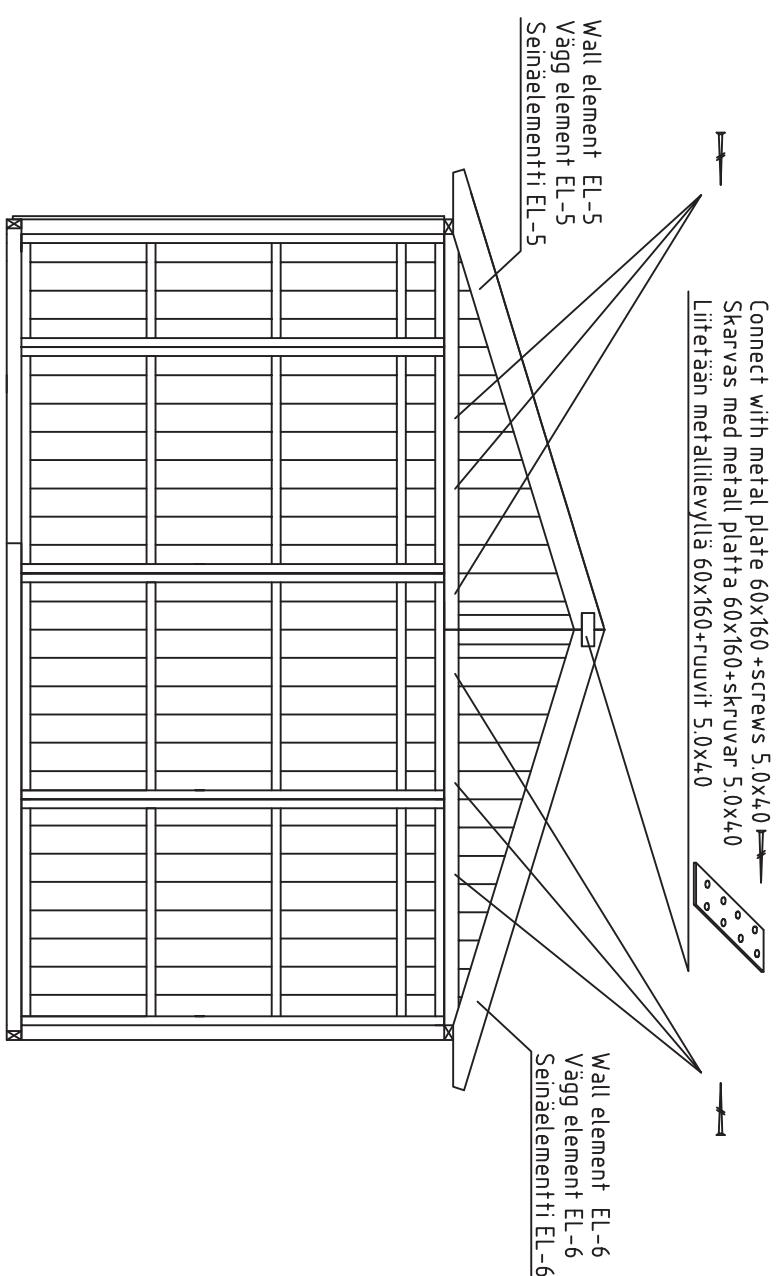

Fix wall element EL-5 with back wall elements with screws 5.0x120 together

Fixera vägg element EL-5 med elementat vägg baksida med skruvar 5.0x120 tillsammans


Kinnitä seinäälementti EL-5 yhteen takaseinän elementit ruuveilla 5.0x120

Fix wall element EL-6 with back wall elements with screws 5.0x120 together

Fixera vägg element EL-6 med elementat vägg baksida med skruvar 5.0x120 tillsammans

Kinnitä seinäälementti EL-6 yhteen takaseinän elementit ruuveilla 5.0x120


✓ 2.0



**Polhus**

House	F 3939-16 Möja	Sheet	1/4
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg


# Ferms - Takläggning - Kattoparrut

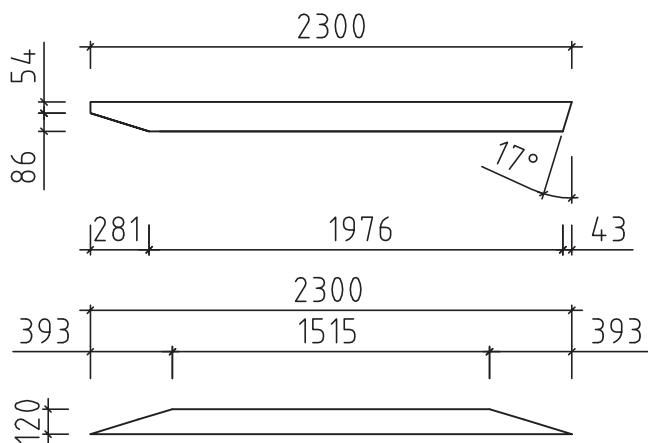

Rafter-kattopalki-takbjälkar 43x140x2300 6pcs-st-kpl

Tie beam-kattopalki-takbjälkar 28x120x2330 6pcs-st-kpl

Connect with metal plate 60x160  
+screws 5.0x40 12pcs  
on both sides of the ferm  
Skarvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40  
båda sidor takläggning  
Liitetään metallilevyllä 60x160+ruuvit 5.0x40  
molemmen puolin kattoparru

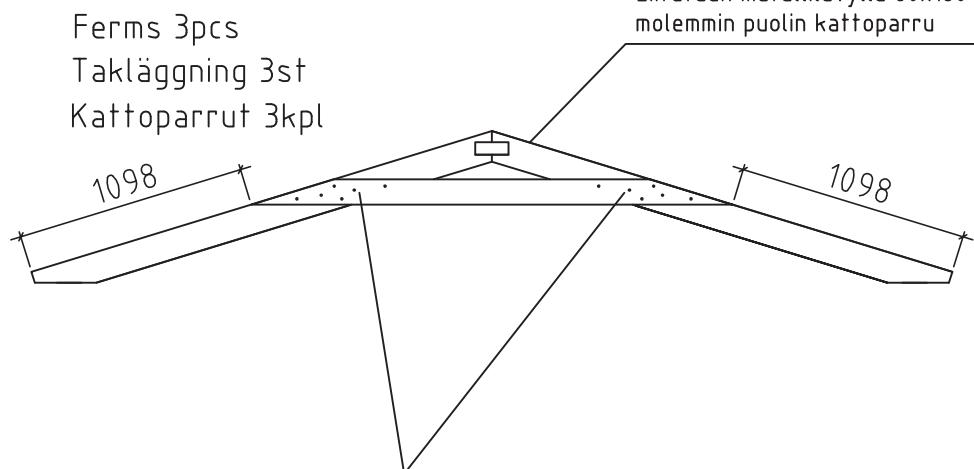

Connect with nails 4x100 (6+6)  
on both sides of the ferm

Skarvas med spikar 4x100 (6+6)  
båda sidor takläggning

Liitetään naulalla 4x100 (6+6)  
molemmen puolin kattoparru

V 2.0




House	F3939-16 Möja	Sheet	15
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F3939-16 Möja.dwg

## Ferm install-installerar takläggning-kattoparru asennus

Connect with steel corner 90x90x65+ screws 4.5x45 8pcs  
 Skarvas med metallvinkel 90x90x65+skruvar 4.5x45 8st  
 Liitetään kulmarauhaan 90x90x65+ruuvit 4.5x45 8kpl



Roofboard L=2330mm R1  
 Takbräde L=2330mm R1  
 Kattolauta L=2330mm  
 Roofboard L=1390mm R3  
 Takbräde L=1390mm R3  
 Kattolauta L=1390mm

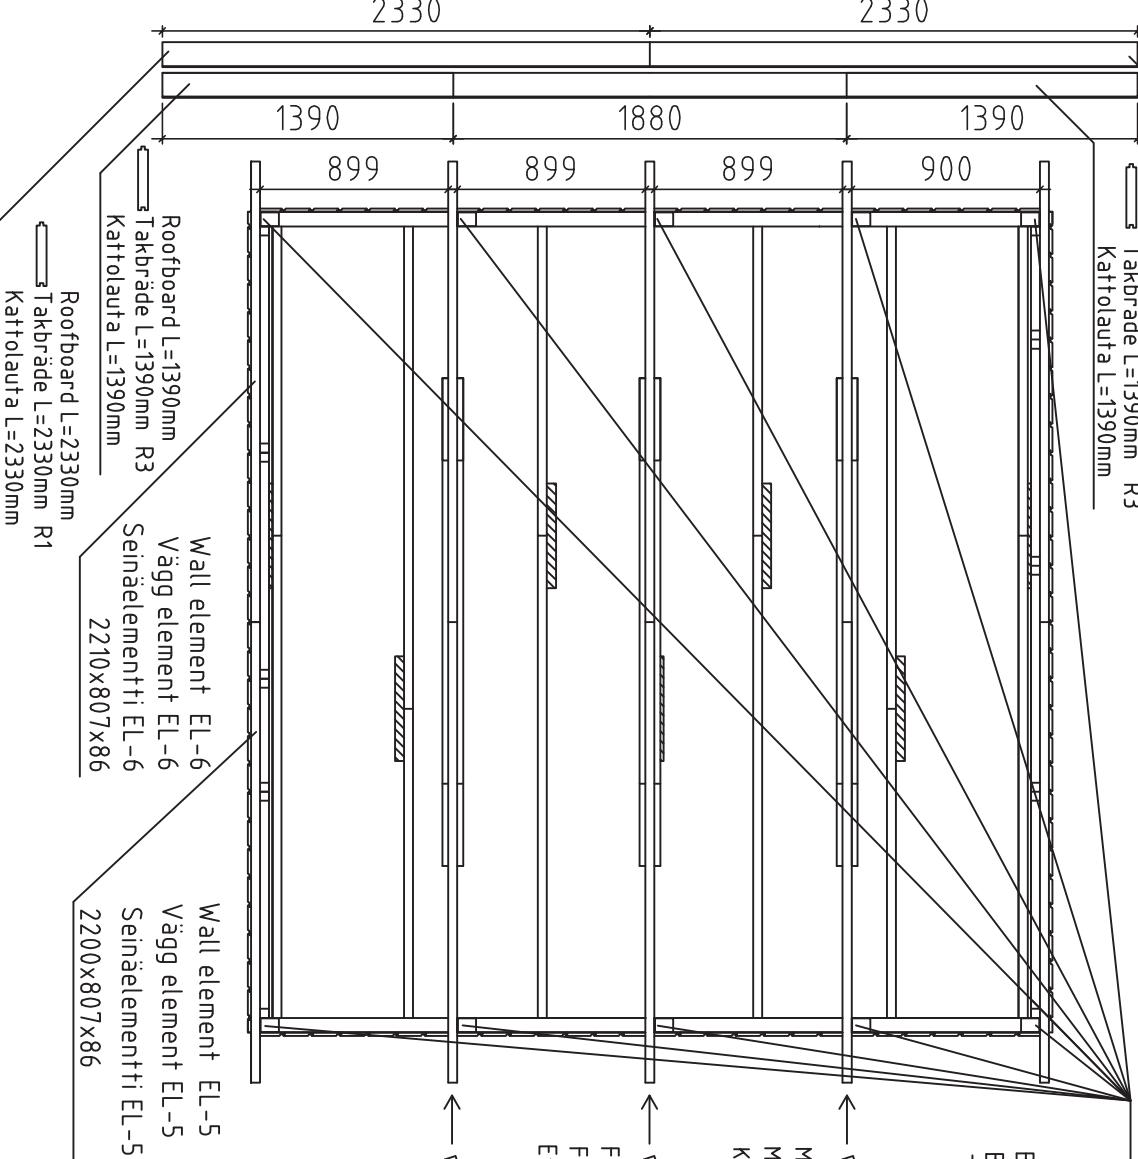


NB!!! Change the roofboard positions after every row  
 NB!!! Skarva tak brädorna olika efter varje rad  
 NB!!! Muuta kattolautojen sijaintia jokaisen rivin jälkeen  
 $\checkmark$  2.0

Roofboard L=1390mm R3  
 Takbräde L=1390mm R3  
 Kattolauta L=1390mm  
 Roofboard L=2330mm R1  
 Takbräde L=2330mm R1  
 Kattolauta L=2330mm

Wall element EL-6  
 Vägg element EL-6  
 Seinäelementti EL-6  
 2210x807x86

Wall element EL-5  
 Vägg element EL-5  
 Seinäelementti EL-5  
 2200x807x86



House	F 3939-16 Möja	Sheet	16
Drawing		Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K. Konsand	File	F 3939-16 Möja.dwg

# 2 PAKKI L<2.35m

Pos	F3939-16 Möja	Nr. Pcs.	Profile (mm)	L (mm)
	<p>Wall element EL-7 1pc Vägg element EL-7 1st Seinäelementti EL-7 1kpl 400x2060x86</p> <p>Wall element EL-1 6pcs Vägg element EL-1 6st Seinäelementti EL-1 6kpl 550x2060x86</p> <p>Wall element EL-5 2pcs Vägg element EL-5 2st Seinäelementti EL-5 2kpl 2200x807x86</p> <p>Wall element EL-6 2pcs Vägg element EL-6 2st Seinäelementti EL-6 2kpl 2210x807x86</p> <p>Wall element EL-8 3pc Vägg element EL-8 3st Seinäelementti EL-8 3kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element EL-2 1pc Vägg element EL-2 1st Seinäelementti EL-2 1kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element EL-3 1pc Vägg element EL-3 1st Seinäelementti EL-3 1kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element EL-9 1pc Vägg element EL-9 1st Seinäelementti EL-9 1kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element EL-4 8pcs Vägg element EL-4 8st Seinäelementti EL-4 8kpl 1090x2060x86</p>			
RA	RAFTER - KATTOPALKI - TAKBJÄLKAR	6	43x140	2300
TB	TIE BEAM - KATTOPALKI - TAKBJÄLKAR	6	28x120	2300
FB1	FLOORBEAM - LATTIAPALKI - GOLVBJÄLKAR	11	45x90	2330
FB2	FLOORBEAM - LATTIAPALKI - GOLVBJÄLKAR	2	45x90	1450
FB3	FLOORBEAM - LATTIAPALKI - GOLVBJÄLKAR	9	45x90	1500
FB4	FLOORBEAM CONNECTING BEAM - LATTIAPALKI YHDISTAMISPALKIT BRÄDE FÖR GOLVBJÄLKAR SAMMANSLAGNING	7	45x90	500
SCB	SIDEWALL CONNECTING BEAM - SIVUSEINÄ YHDISTAMISPALKIT BJÄLKAR FÖR SIDOVÄGG SAMMANSLAGNING	4	43x70	1905
F1	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE	34 43	19x114 19x88	2330 2330
F2	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE	34 43	19x114 19x88	1300 1300
R1	ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE	44 56	19x114 19x88	2330 2330
R2	ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE	20 26	19x114 19x88	1880 1880
R3	ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE	40 52	19x114 19x88	1390 1390
FF	FLOOR FILLET - LATTIALISTA - GOLVLIST	8	19x35	1900
GB	GABLE BOARD - KAAPELILAUTA - GADELBRÄDA	2330 2293	19x120	2330
RFF	ROOF FELT FILLET - KATON PÄÄTYLAUTA - BRÄDE OVANPÅ GADELBRÄDE	4	19x35	2330
Kood F3939-16 Möja Materjal File F3939-16 Möja.dwg Leht 17				


2 PAKKI L<2.35m

Pos	F3939-16 Möja	Nr. Pcs.	Profile (mm)	L (mm)
GS	GABLE SLAT - KAAPELILISTA - VINDLIST	2300 2291	4	30x40 2300
K9	WALL CONNECTING BEAM - YHDISTAMISPALKIT BJÄLKAR SAMMANSLAGNING	1860	2	45x70 1860
EB1 EB2	EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTSBRÄDE		4 4	19x120 2330 19x120 1906
EB3	EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTSBRÄDE		4	19x90 1906
CB1 CB2	CORNER BOARD - KULMANLAUTA - HÖRNBRÄDE		4 4	19x90 2060 19x90 2040
FIL1	FILLING BOARD- TÄYTTÖLAUTA- FYLLNADSBRÄDE		2	16x80 2060
FIL2	FILLING BOARD- TÄYTTÖLAUTA- FYLLNADSBRÄDE		2	16x70 2060
	WINDOW CROSSES - IKKUNARISTIKKO - SPRÖJS		1	
	DOORCROSSES - OVENRISTIKKO - SPRÖJS		1	
	DOOR HANDLE - OVEN KAHVA - DÖRR HANDTAG		2	
	DOOR LOCK+KEYS - OVENLUKKO+AVAIN - DÖRRLAS+NYCKLAR		2	
	WINDOW HANDLE - IKKUNA KAHVA - FÖNSTER HANDTAG		1	
	STEEL CORNER - KULMARAUTA - VINKELJÄRN		10	90x90 65
	STEEL PLATE - METALLILEVY - METALLPLATTA		8 2	2,5x60 160 2,5x60 120
	NAILS - NAULAT - SPIKAR	FERMS - KATTOPARRU - TAKLÄGGNING	72	4,0 100
	NAILS - NAULAT - SPIKAR	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE	715	2,5 60
	NAILS - NAULAT - SPIKAR	ROOFBOARD - KATTOLAUTAT - TAKBRÄDE	32	2,0 40
	NAILS - NAULAT - SPIKAR	SKIRTING SLAT - LATTIALISTA - GOLVLIST		
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	ELEMENT - ELEMENT - ELEMENTTI NR.5 & NR.6	12	5,0 120
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBÄLKAR	260	4,5 70
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	ELEMENT CONNECTING - ELEMENTTI YHDISTAMIS	120	5,0 40
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	- ELEMENT SAMMANSLAGNING		
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	STEEL PLATE - METALLILEVY - METALLPLATTA		
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	STEEL CORNER - KULMARAUTA - VINKELJÄRN EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTSBRÄDE	290	4,5 45
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	CORNER BOARD - KULMANLAUTA - HÖRNBRÄDE		
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	GABLE BOARD - KAAPELILAUTA - GAVELBRÄDA GABLE SLAT - KAAPELILISTA - VINDLIST		
	SCREW - RUUVIT - SKRUVAR	ROOF FELT FILLET - KATON PÄÄTYLAUTA - BRÄDE OVNPA GAVELBRÄDE		
WS-1	WINDOW WATER SILL		1	
WS-2	WATER SILL	100 25 105 20 1100	2	
	Kood F3939-16 Möja	Materjal	File F3939-16 Möja.dwg	Leht 18


Detta är ett förslag för hur man kan placera plintarna (100-200 mm i diameter) för golvbjälkaget. Golvbjälkarna är med i byggsatsen, men inte plintarna. Använder man exempelvis 500-600mm långa murblock så kan man halvera antalet punkter. Lägg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Täältä on ehdotus siitä, miten (100-200 mm läpimittaiset) jalat voidaan sijoittaa alapohjaa varten. Lattiapalkit ovat rakennussarjassa, mutta jalkoja ei ole. Kun käytetään esimerkiksi 500-600 mm pitkiä harkkoja, voidaan pisteen määriä puolittaa. Aseta betonin ja puun välin kosteudelta suojaava pahvi

A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture

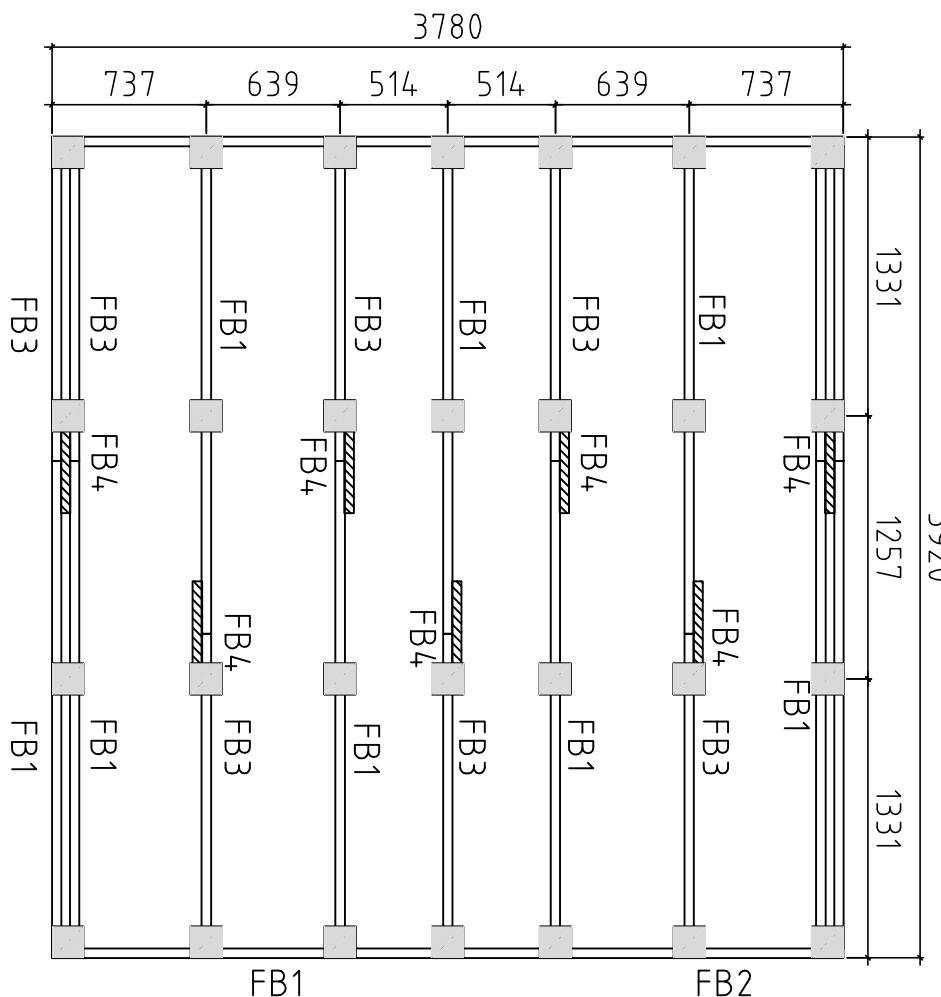

✓ 2.0



House	F 3939-16 Möja	Sheet	19
Drawing	Plan	Scale	1:35
Material		Date	24.07.2017
Drawer	K.K.	File	F 3939-16 Möja.dwg
